

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⴷⵓ  
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵉ ⵏ  
ⵏⵓⵔⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵉ




المملكة المغربية  
وزارة التضامن والإعماج الاجتماعي  
والأسرة




ROYAUME DU MAROC  
MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ  
DE L'INSERTION SOCIALE ET DE LA FAMILLE

## تقرير حول

# تقدم إنجاز البرنامج الوطني "مدن ولوجة"

شتتبر 2023



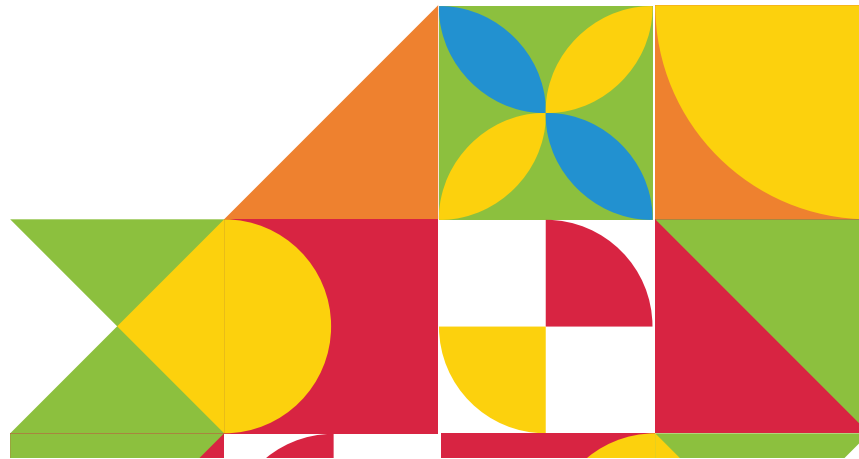


# محتوى التقرير




- 1- السياق ..... 7
- 2- معطيات إحصائية حول الولوجيات والإعاقة..... 9
- 3- المرتكزات الرئيسية المؤطرة لمجال الولوجيات ..... 10
- 4- البرنامج الوطني «مدن ولوجة»: تقديم ..... 13
- 5- أهداف البرنامج..... 14
- 6- مكونات البرنامج..... 15
- 7- مسار إنجاز البرنامج..... 16
- 8- الجماعات الترابية المنخرطة في البرنامج..... 18
- 9- التوزيع الجغرافي للمدن المنخرطة في البرنامج..... 19
- 10- الميزانيات المرصودة والعدد التقديري للمستفيدين..... 20



- 11- منجزات البرنامج : في مجال تشخيص وإرساء الولوجيات ..... 22
- 1- مدن السلسلة الأولى : الدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة ..... 22
- 2- مدن السلسلة الثانية : أكادير وإنزكان والجديدة ويني ملال وسلا والقنيطرة ومكناس وفاس وتازة ..... 28
- 3- مدن السلسلة الثالثة : آسفي ورزازات والداخلة وتطوان وسوق أربعاء الغرب ووزان وبركان وتيزنيت وبوجدور ..... 40
- 4- كرونوكرام تركيبى ..... 46
- 12- منجزات البرنامج : مجال تقوية القدرات ..... 47
- 13- منجزات البرنامج : مجال التوعية والتحسيس ..... 48
- 14- أعمال موازية للبرنامج : تطوير الرصيد المعيارى للولوجيات ..... 50
- 15- أعمال موازية للبرنامج : تطوير الشراكة مع الفاعلين ..... 51
- 16- أهم استنتاجات زيارات تتبع الميدانية ..... 54
- 17- أبرز الصعوبات المطروحة ..... 55





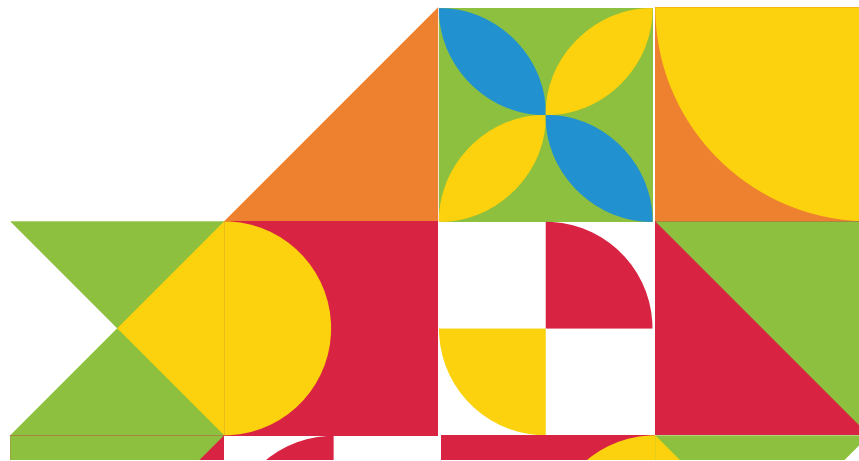

# 1. السياق

تعتبر مسألة توفير الولوجيات مسؤولة مشتركة تتقاسمها جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية كل على حسب تدخله، في حين تتولى وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، عملية التنسيق مع مختلف المتدخلين لإرساء الولوجيات الضرورية واستحضارها في كافة البرامج والمشاريع المبرمجة ونشر الوعي بأهميتها خاصة لدى الفاعلين الترابيين.

فمجال الولوجيات بشتى أنواعها مؤطر بموجب أحكام ومقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والذي يحدد شروط ومعايير الولوجيات. كما سيمكن القانون الإطار رقم 13 - 97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتاريخ 19 ماي 2016، من ملائمة التشريع المغربي مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل، حيث تنص المادة 21 من القانون الإطار على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية القائمة أو التي في طور التشييد، وكذا وسائل النقل والاتصال ولوجة.

كما أن السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2016-2026) تضم رافعات استراتيجية خاصة بالولوجيات بشتى أنواعها، على اعتبار الولوجيات كأحدى المدخلات الرئيسية للتمتع بالحقوق المكفولة قانونيا من بينها تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لجميع الخدمات والمتطلبات اليومية من أجل ضمان اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة العامة.

ولبلوغ طموح المغرب في أفق 2035 والمتمثل في تنزيل النموذج التنموي الجديد، يتطلب تحقيق خمسة أهداف تنموية رئيسية من بينها مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويقوي الرابط الاجتماعي من خلال منح الفرص للجميع دون استثناء وتعزيز الاستقلالية الذاتية وتنمية القدرات لكل المغاربة نساء ورجالا وكذا النهوض بحماية الفئات الهشة. ولا يتأتى ذلك لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة إلا بتعزيز وتنفيذ كافة حقوقها وفي مقدمتها تلك المرتبطة بمجال الولوجيات كونها بوابة رئيسية وممر أساسي لولوج الجميع الحقوق.

وقد أولى البرنامج الحكومي 2021-2026 أهمية بالغة للشق الاجتماعي وخاصة من خلال دعم الفئات الهشة وتعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة



وتسهيل اندماجهم الفعلي في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم.

واعتبارا لكون الولوجيات منطلق أساسي لكل سياسة اندماجية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث أنها تساهم بشكل رئيسي في الرفع من استقلاليتهم، عبر إزالة كل الحواجز البيئية، المادية، التنظيمية وكذا الثقافية التي تحول دون ممارسة حقوقهم وولوجهم لمختلف الخدمات والفضاءات المستقبلية للعموم ووسائل النقل والتواصل، تعمل الوزارة في المساهمة على تنزيل عدة مشاريع في مجال الولوجيات، وذلك بتنسيق مع الفعاليات المعنية.





## 2. معطيات إحصائية حول التكنولوجيات والإعاقة\*

نسبة انتشار الإعاقة بالمغرب هي 6,8%، أي ما يعادل 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة تختلف أنواعها ودرجاتها

50,2% من الأشخاص في وضعية إعاقة لديهم قصور حركي، 25,1% لديهم قصور ذهني، 23,8% لديهم قصور بصري، 15,8% لديهم قصور سمعي و 10,5% لديهم قصور صوتي

83,4% من الأشخاص في وضعية إعاقة لديهم إعاقة مكتسبة بسبب عامل خطر (مرض مكتسب أو مهني؛ مشكل صحي ناتج عن الشيخوخة؛ حادث مهني أو مروري أو غيره)، و 16,6% لديهم إعاقة خلقية (ناتجة عن صعوبات في الحمل والولادة أو عن مرض أو تشوه خلقي أو وراثي)

30,5% من الأشخاص في وضعية إعاقة يجدون صعوبات للتولوج إلى مقر سكنهم انطلاقا من الخارج؛ 36,6% للتولوج إلى وسائل النقل العام؛ 48,8% في التحرك داخل مقر سكنهم؛ و 83,3% لا يتوفرون على تجهيزات منزلية تتناسب مع إعاقاتهم

التكنولوجيات شرط أساسي ومطلب معبر عنه بقوة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التولوج لمختلف الخدمات التعليمية والصحية والأنشطة المهنية والمشاركة الاجتماعية والسياسية

\*حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014



# 3. المرتكزات الرئيسية المؤطرة لمجال الولوجيات

## 1. المرجعيات الاستراتيجية

الاستور

ينص في ديباجته على محاربة كافة أشكال التمييز المبني على الإعاقة، ومادته 34 على التزام السلطات العمومية بإعداد وتنفيذ سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

الاتفاقية الدولية لحقوق  
الأشخاص ذوي الإعاقة

تنص المادة 9 المتعلقة بإمكانية الوصول، على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة من طرف البول الأعضاء لتمكين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات

السياسة العمومية المتدرجة للنهوض  
بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

تتضمن محاور استراتيجية تهم الولوجيات بثقتى أنواعها، وتشكل إطارا لتنسيق مختلف التدخلات في هذا المجال

مخططي العمل الوطني للسياسة العمومية

- مخطط العمل الوطني الأول (2017-2021) : يضم من بين محاوره الستة، محورا خاصا ببيئة ميسرة للولوج، تم العمل على ترجمته على شكل أربعة أوراش و 20 مشروعا و104 تدبيرا ؛
- مشروع مخطط العمل الوطني الثاني (2022-2026)



## 2. الإطار التشريعي والتنظيمي

### القانون الإطار رقم 13 - 97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (19 ماي 2016)

يؤكد على كون الولوجيات مبدأ عام لتنفيذ القانون. كما أنه يأتي لملائمة التشريعات الوطنية المرتبطة مع مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

### القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات (10 يونيو 2003)

ينص على ضرورة إدراجها في ضوابط البناء وتصاميم التهئية وجعلها كشرط للبت في طلبات تراخيص التجزيء والمجمعات السكنية



### المرسوم رقم 2.11.246 (30 شتنبر 2011) المتعلق بتطبيق قانون الولوجيات

يحدد شروط ومعايير الولوجيات المعمارية والعمرانية وتلك المرتبطة بالنقل والاتصال

القرار المشترك رقم 2306.17 المحدد للخصائص التقنية وقياسات مختلف الولوجيات العمرانية  
نشر في ج.ر. في 1 مارس 2018

القرار المشترك رقم 3146.18 المحدد للخصائص التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية  
نشر في ج.ر. في 10 أكتوبر 2019

### منشور رئيس الحكومة رقم 2019/14 (9 غشت 2019) المتعلق بتحسين ظروف استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة بالمرفق العمومي

يحث إدارات الدولة والهيئات التابعة لها على اتخاذ التدابير اللازمة للتأهيل المادي للبنيات والمقرات المفتوحة للعموم وتحسين الاستقبال والارشاد والتوجيه وشروط تقديم خدمات المرفق العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة



### 3. إطار معياري في طور الاستكمال


القرار المشترك المحدد للخصائص التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي:  
**أعد ووضع في الأمانة العامة للحكومة للمصادقة**

القرار المشترك المحدد للخصائص التقنية للولوجيات، في مختلف محطات المسافرين ومحطات التوقف :  
**إعداد المسودة الأولى**

القرار المشترك المحدد للخصائص التقنية المتعلقة بولوجيات الاتصال :  
**إعداد المسودة الأولى**



## 4. البرنامج الوطني «مدن ولوجة»: تقديم



لأجل تطوير الولوجيات، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على إطلاق برنامج «مدن ولوجة» سنة 2018، كمشروع عملي يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي (2012-2016) بمدينة مراكش، لتوسيع التجربة على المستوى الوطني، وتجسيدها للحق في الولوجيات وتكريسها للعدالة المجالية وللمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفا لتكلفة الإعاقة وأعبائها.

ويندرج هذا البرنامج في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجماعات الترابية لمدينة الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وجدة، فاس، مكناس، بني ملال، الجديدة، سلا، انزكان، أكادير، القنيطرة، تازة، بركان، تطوان، وزان، سوق أربعاء الغرب، آسفي، ورزازات، الداخلة، تيزنيت وبوجدور.

ويشكل تنفيذ هذا البرنامج فرصة للوقوف على واقع الولوجيات بكل مدينة من خلال إجراء تشخيص دقيق للحواجز المادية التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويستند هذا التشخيص على معطيات علمية وتقنية دقيقة كما يتم تنفيذه بمشاركة ومساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وجمعياتهم وطبعا بتنسيق كامل مع المصالح التقنية للجماعات الترابية الشريكة.

كما تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على المساهمة المادية والمواكبة التقنية في إرساء أشغال الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكز المدن؛ وهي في الحقيقة مساهمة رمزية حيث أن متطلبات إرساء الولوجيات على المستوى الترابي تفوق بكثير الإمكانيات التي يمكن أن ترصدها الميزانية السنوية للوزارة.



## 5. أهداف البرنامج

تيسير تنقل وولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات  
والمتطلبات اليومية

المساهمة في تبني بعد الولوجيات في مختلف البرامج  
التنموية الوطنية والترابية

جعل أهم فضاءات المدن سهلة الولوج لكافة الأشخاص  
في وضعية إعاقة

إرساء تجربة نموذجية واقعية للولوجيات المادية بمراكز  
المدن

تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى المكتسبة بين  
الفعاليات المعنية في موضوع الولوجيات



## 6. مكونات البرنامج



## 7. مسار إنجاز البرنامج

### مرحلة التشخيص

#### 1- إنجاز تشخيص للحالة الراهنة



#### 2- تقديم مقترحات حلول



## مرحلة الإرساء

### 1- الدراسة التقنية وإعداد التصاميم



### 2- إرساء أشغال الولوجيات

## 8. الجماعات الترابية المنخرطة في البرنامج

### السلسلة الثالثة

- ◀ آسفي
- ◀ بركان
- ◀ ورزازات
- ◀ سوق أربعاء الغرب
- ◀ الداخلة
- ◀ تيزنيت
- ◀ وزان
- ◀ بوجدور
- ◀ تطوان

### السلسلة الثانية


- ◀ إنزكان
- ◀ مكناس
- ◀ سلا
- ◀ الجديدة
- ◀ القنيطرة
- ◀ بني ملال
- ◀ فاس
- ◀ أكادير
- ◀ تازة

### السلسلة الأولى

- ◀ الرباط
- ◀ الدار البيضاء
- ◀ طنجة
- ◀ وجدة



## 9. التوزيع الجغرافي للمدن المنخرطة في البرنامج

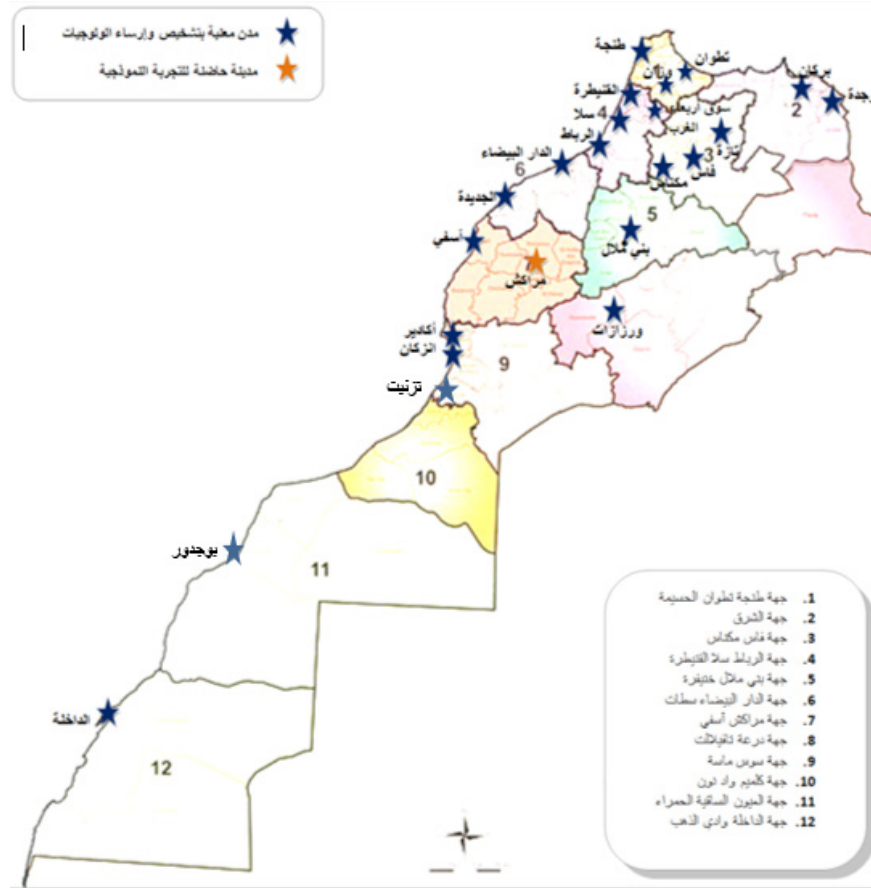

## 10. الميزانيات المرصودة والعدد التقديري للمستفيدين

تاريخ توقيع الملحق المتعلق بالتحويل المالي للوزارة	التكلفة الاجمالية	مساهمة الجماعات الترابية الشريكة	المساهمة المالية للوزارة	العدد التقديري للمستفيدين في وضعية الإعاقة	نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الجهوي (2014)	عدد السكان (2014)	الجماعة
25/06/2018	16 000 000	8 000 000	8 000 000	134 393	% 4	3 359 818	الدار البيضاء
02/07/2018	3 400 000	-	3 400 000	27 158	% 4.7	577 827	الرباط
02/06/2018	3 300 000	-	3 300 000	121 479	% 11.4	1 065 601	طنجة
18/10/2018	7 300 000	2 000 000	5 300 000	34 598	% 7	494 252	وجدة
10/03/2018	3 100 000	1 000 000	2 100 000	46 167	% 4.7	982 163	سلا
05/12/2018	2 150 000	-	2 150 000	20 702	% 4.8	431 282	القنيطرة
05/10/2018	2 900 000	500 000	2 400 000	10 332	% 5.3	194 934	الجديدة
04/06/2019	5 100 000	2 550 000	2 550 000	37 122	% 8.8	421 844	أكادير
23/07/2018	4 500 000	2 500 000	2 000 000	11 469	% 8.8	130 333	إنزكان
15/08/2018	2 000 000	-	2 000 000	18 882	% 9.8	192 676	بني ملال

15/03/2018	2 600 000	500 000	2 100 000	11 134	% 7.5	148 456	تازة
05/06/2019	3 350 000	1 000 000	2 350 000	88 560	% 7.7	1 150 131	فاس
05/08/2019	2 950 000	600 000	2 350 000	49 961	% 9.6	520 428	مكناس
01/10/2019	2 250 000	-	2 250 000	16 351	% 5,3	308 508	آسفي
05/03/2020	1 500 000	-	1 500 000	3 082	% 2,9	106 277	الداخلة
13/12/2019	1 000 000	-	1 000 000	7 647	% 7	109 237	بركان
15/05/2020	4 000 000	-	4 000 000	43 410	% 11,4	380 787	تطوان
16/07/2020	1 000 000	-	1 000 000	6 254	% 8,8	71 067	ورزازات
13/12/2019	1 000 000	-	1 000 000	6 795	% 11,4	59 606	وزان
13/12/2019	1 000 000	-	1 000 000	3 325	% 4,8	69 265	سوق أربعاء
03/05/2021	1 000 000	-	1 000 000	6 576	% 8.8	74 699	تيزنيت
19/04/2022	1 000 000	-	2 000 000	5 715	% 13.4	42 651	بوجدور
	<b>73 400 000</b>	<b>18 650 000</b>	<b>54 750 000</b>	<b>698 821</b>	<b>-</b>	<b>10 774 492</b>	<b>المجموع</b>



# 11. منجزات البرنامج : في مجال تشخيص وإرساء الولوجيات

## 1. مدن السلسلة الأولى : الدار البيضاء والرباط وطنجة ووجدة

### المنجزات المشتركة بين مدن السلسلة الأولى

- ◀ إنجاز جرد للاحتياجات في مجال التهيئة الحضرية لتحسين الولوجيات المرتبطة بالممرات والفضاءات والبنيات المفتوحة للعموم بالمدن الأربعة، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الوزارة والبنك الدولي (2012 - 2016)؛
- ◀ التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجماعات الأربعة؛
- ◀ تعيين أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع وتنفيذ بنود الاتفاقية؛
- ◀ رصد وتحويل مبالغ مساهمة الوزارة لإنجاز أشغال الولوجيات برسم السنة المالية 2018 للجماعات الأربع (20 مليون درهم)؛
- ◀ تحديد المحور النموذجي المعني بأشغال الولوجيات يضم الممرات العمومية والساحات والفضاءات المفتوحة للعموم والبنيات العمومية للجماعات الأربعة؛
- ◀ إعداد دفاتر التحملات الخاصة وأنظمة الاستشارة للدراسة التقنية والطوبوغرافية والتصاميم الهندسية لصفقات الأشغال للجماعات الأربعة.
- ◀ إعداد دفاتر التحملات الخاصة وأنظمة الاستشارة لصفقات أشغال الولوجيات لمدن الدار البيضاء ووجدة وطنجة.



## المنجزات الخاصة: مدينة الدار البيضاء

◀ إطلاق صفقتي إرساء الأشغال عن طريق شطرين شملتا 24 بناية مفتوحة للمرتفقين.


◀ بخصوص صفقة الشطر الأول ، والتي تهتم 12 بناية (مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، مقر جماعة الدار البيضاء، مقاطعة سيدي بليوط، مقاطعة أنفا، مقاطعة المعاريف، مقاطعة الحي الحسني، دار الخدمات، معهد الموسيقى والفنون، الإدارة الجبائية للجماعة، مدرسة الفنون الجميلة، السوق المركزي والمجمع الثقافي محمد السادس)، فقد تم انتهاء من الأشغال لجميع البنايات، باستثناء مقر ولاية جهة الدار البيضاء - سطات.

◀ أما بخصوص صفقة الشطر الثاني، والتي تهتم 12 بناية أخرى (مقاطعة عين الشق، مقاطعة سيدي عثمان، مقاطعة بن مسيك، مقاطعة سباتة، مقاطعة مولاي رشيد، مقاطعة سيدي بنوصي، مقاطعة عين السبع، مقاطعة الحي المحمدي، مقاطعة الصخور السوداء، مقاطعة الفداء، مقاطعة مرس السلطان ومقاطعة سيدي مومن)، فقد تم إنجاز كل الأشغال بهذه المقرات بالإضافة إلى بعض الأشغال همت ملحقته 20 غشت بمقاطعة مولاي رشيد وملحقته درب مولاي الشريف والمركب الثقافي بالحي المحمدي وملحقته الفردوس بمقاطعة الحي الحسني وملحقته عين الشق والشباك الوحيد بمقاطعة عين الشق.

وشملت الأشغال المنجزة في البنايات المذكورة في الصفقتين ركن السيارات، المنحدرات الخارجية والداخلية للبنيات، الخطوط التوجيهية ولليقظة خارجيا وداخليا التي تساعد تنقل المكفوفين وضعاف البصر، المرافق الصحية، المصاعد، مقابض اليبدين والشاشات التلفزيونية الخاصة لتحسين استقبال وتوجيه المرتفقين خاصة من فئة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية.

◀ للإشارة، فإن تكلفة صفقة الشطر الأول بلغت 7.540.230 درهم مع احتساب جميع الرسوم، بينما بلغت صفقة الشطر الثاني 5 933 322 درهم مع احتساب جميع الرسوم.

◀ القيام بزيارة تفقدية والاطلاع على جودة الأشغال والتأكد من احترام المعايير المطلوبة في المجال، وكذا التسلم المؤقت للأشغال الموقته للشركتين.



مقر الجماعة - مرفق صحي ولوج

مدرسة الفنون الجميلة - منحدر داخلي ولوج



مقر الجماعة - خطوط توجيهية داخلية

مقر مقاطعة أنفا - موقف السيارات مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة



مقر مقاطعة أنفا - مدخل رئيسي ولوج



## المنجزات الخاصة مدينة وجدة



دراسة الوثائق التقنية والتصاميم لصفقة الأشغال

- ▶ إنجاز الدراسة التقنية والطبوغرافية وإعداد التصاميم اللازمة للمحيط النموذجي المعني بأشغال الولوجيات وكذا دفاتر التحملات الخاصة وأنظمة الاستشارة لصفقات الأشغال، من طرف مكتب الدراسات، بتكلفة 360.000 درهم.
- ▶ إطلاق صفقة الأشغال وانتقاء الشركة، يوم 02 دجنبر 2021، وذلك بتكلفة 4.638.991,20 درهم.

▶ وتهم هذه الصفقة المواقع التالية : شارع الحسن الثاني وشارع التهامي الجليلي وحديقة لالة مريم وحديقة لالة عائشة، على أن تضم صفقة أخرى المقرات الثلاثة المفتوحة للعموم وهي : مقر جماعة وجدة، الملحقة الإدارية الأولى للجماعة الموجودة بالمدينة القديمة والملحقة الإدارية الثانية للجماعة الموجودة قرب الملعب البلدي.

▶ أهمية توفير مختلف الولوجيات الضرورية والمناسبة في حديقتي لالة عائشة ولالة مريم، نظرا لمكانتهما التاريخية التي تعود لفترة الحماية وكذا باعتبارهما متنفس لكافة ساكنة المدينة ولزوارها أيضا، حيث يضمن العديد من الساحات الترفيهية والرياضية والفنية (حلبة ألعاب القوي، نادي كرة المضرب، نادي الفروسية، حديقة ألعاب الأطفال، المسبح البلدي الكبير والمسبح المغطى، ساحات خضراء، مسرح الهواء الطلق، مقهى، فضاء للمعارض...).

▶ للإشارة، فإن الشارعين المختارين في الصفقة الأولى (شارع الحسن الثاني وشارع التهامي الجليلي) يضمنان إلى جانبهما العديد من المقرات المفتوحة للعموم، من بينها مقر الجهة الشرقية والمركز الاستشفائي الجامعي وولاية الأمن.

▶ عقد لقاء تحضيري مع الشركة المكلّفة وإنجاز جميع الأشغال المتضمنة في الصفة والقيام بزيارة تفقدية والإطلاع على جودة الأشغال المنفذة.



ملتقى وولوج يجمع شارع الحسن الثاني وشارع التهامي الجليلي



توفير الولوجيات الضرورية بملتقى شارع الحسن الثاني وشارع محمد السادس




إرساء شرائط البقطة وحواجز حفظ السير بمرمات العبور في ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع الشهداء



إرساء منحدرات ولوجة بالممرات الداخلية بحديقة لالة مريم



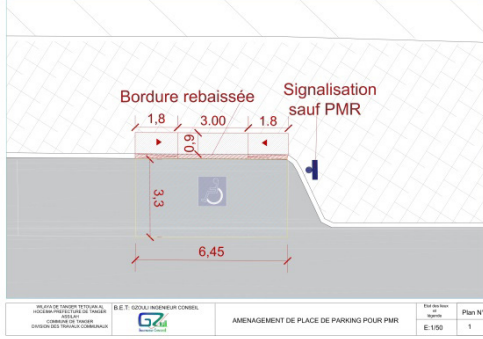

تصميم لتهيئة ركن السيارات خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة حركية



المواقع المعنية بأشغال الولوجيات

## المنجزات الخاصة : مدينة طنجة

- ◀ إنجاز الدراسة التقنية والطبوغرافية وإعداد التصاميم اللازمة للمحيط النموذجي المعني بأشغال الولوجيات وكذا دفاتر التحملات الخاصة وأنظمة الاستشارة لصفقات الأشغال، من طرف مكتب الدراسات المكلف، وذلك بكلفة قدرها 153.450 درهم.
- ◀ إطلاق صفقة الأشغال، وخلال يوم 4 غشت 2021، المخصص لفتح الأظرفة ودراسة الملفات، لم يتقدم أي مرشح، مما استدعى مراجعة محتوى بعض مواد دفتر التحملات ونظام الاستشارة، خاصة التكلفة التقديرية للصفقة ومعايير تصنيف الشركات المطلوبة والاقتصار فقط على الممرات والفضاءات العمومية، وأن يتم تخصيص صفقة ثانية تهتم البنايات المفتوحة للعموم.
- ◀ بخصوص صفقة أشغال الولوجيات، شملت كافة الممرات والبنايات والساحات المحددة سابقا في الدراسة التقنية والطبوغرافية، وهم:
  - الممرات العمومية: شارع محمد السادس، شارع محمد الخامس، شارع فاس، شارع مولاي يوسف، شارع يوسف بن تاشفين وشارع صلاح الدين الأيوبي.
  - الفضاءات والساحات العمومية: حديقة الأمم بالمدينة القديمة، ساحة بدر، ساحة بني بولوين.
  - البنايات المفتوحة للعموم: مقر جماعة طنجة، مقر مقاطعة طنجة، مقر الملحقة الإدارية للجماعة (مقر شالة أو المقر رقم 4).
- ◀ إطلاق الصفقة الأولى وتعيين الشركة المكلفة ومباشرة عملية تنفيذ أشغال الولوجيات، وذلك بتكلفة قدرت ب 2.395.190,00 درهم.
- ◀ عقد لقاء تحضيرى مع الشركة المكلفة وبحضور المصالح التقنية وبعض الفعاليات المحلية بما فيها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، خصص لدراسة الجوانب المتعلقة بعملية إرساء الأشغال، يوم 19 يناير 2023.
- ◀ مباشرة عملية إرساء الأشغال.





حديقة نزهة حسان



شارع محمد الخامس

### المنجزات الخاصة : مدينة الرباط

يشمل المحور النموذجي لصفقة الدراسات التقنية والطبوغرافية المواقع التالية :

- ◀ المرات العمومية : شارع محمد الخامس، شارع مولاي الحسن وشارع الجزائر؛
- ◀ البنايات المفتوحة للمرتفقين : مقاطعة حسان، الملحقة الإدارية الأولى سيدي فاتح بالمدينة القديمة والملحقة الإدارية الثانية؛
- ◀ الفضاءات والساحات العمومية : حديقة نزهة حسان، حديقة ساحة جدة الموجودة قرب مقهى الفن السابع وحدائق شارع محمد الخامس قرب الوكالة المغربية للأبناء.

## 2- مدن السلسلة الثانية: أكادير وإنزكان والجديدة وبني ملال وسلا والقنيطرة ومكناس وفاس وتازة

### المنجزات المشتركة بين مدن السلسلة الثانية

- ◀ التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجماعات التسع،
- ◀ التوقيع على ملاحق للاتفاقيات المذكورة مع الجماعات التسع، المتعلقة بالالتزامات المالية للأطراف؛
- ◀ تعيين ممثلي اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع وتنفيذ بنود الاتفاقية؛
- ◀ رصد وتحويل مبالغ مساهمة الوزارة لإنجاز أشغال الولوجيات برسم السنتين الماليتين 2019-2020 (20 مليون درهم) لفائدة الجماعات التسع؛
- ◀ إنجاز الدراسات التشخيصية لواقع الولوجيات بالمدن التسع وتقاسم مخرجات نتائجها مع الفعاليات المحلية، خاصة: المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المكلفة بالبناء والتعمير والتجهيز والنقل العمران والتهيئة الحضرية والوقاية المدنية والسير والجولان...، وكذا تمثيلات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- ◀ تحديد المحور النموذجي المعني بالدراسة التقنية وإعداد التصاميم اللازمة لصفقات الأشغال يضم الممرات والساحات والفضاءات المفتوحة للعموم والبنىات العمومية، المتواجدة ضمن مجال الدراسات التشخيصية والمسحية المنجزة؛
- ◀ إعداد دفاتر التحملات الخاصة وأنظمة الاستشارة للدراسة التقنية وإعداد التصاميم اللازمة لصفقات الأشغال.






لقاء تنسيقي من أجل اختيار السيناريو الأمثل والألوي للولوجيات

### المنجزات الخاصة : مدينة فاس

- ◀ إطلاق صفقة اشغال الولوجيات، وانتقاء الشركة لإنجاز المهمة بتكلفة مالية قدرها 2.298.000,00 درهم، وذلك يوم 31 مارس 2021.
- ◀ يشار أن هذه الصفقة ستشمل شارع لالة أسماء من ملتقى محطة القطار إلى ملتقى مسجد التجمعتي، وكذا شارع لالة مريم من ملتقى مسجد التجمعتي إلى شارع الحسن الثاني.
- ◀ التنسيق بين الوزارة والجماعة، من أجل تسليم أمر بالشروع في إرساء الأشغال، وتنظيم اجتماع تحضيرى مع الشركة المكلفة للشروع بالمهمة.

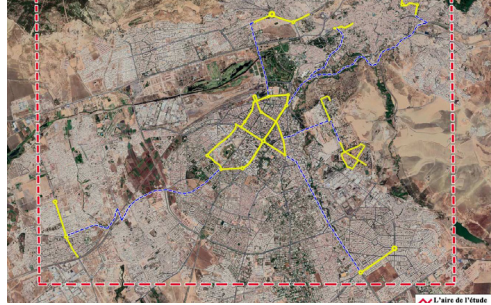

محيط الدراسة التشخيصية

## المنجزات الخاصة : مدينة سلا



لقاء تنسيقي مع المصالح التقنية للجماعة لاقتراح محيط الدراسة




تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية مع الفعاليات المحلية



تقاسم محيط الدراسة المقترح مع أعضاء مكتب الجماعة

- ▶ إطلاق صفقة الدراسة التقنية والطبوغرافية يوم 3 نونبر 2020، وانتقاء مكتب الدراسات المكلف، بتكلفة مالية تقدر ب 312.000 درهم.
- ▶ فيما يخص النطاق المجالي للدراسة التشخيصية المتوافق عليه، فتم تحديده وفق ما يلي:
- ▶ الممرات الرئيسية : شارع الحسن الثاني، شارع ولي العهد، شارع عبد الرحيم بوعبيد، شارع محمد الخامس، شارع 6 نونبر، شارع مولاي يوسف، شارع مديونة، شارع محمد العواد وجزء من شارع المسيرة الخضراء.
- ▶ ويضم هذا النطاق المجالي للدراسة تكتل لأهم التجهيزات والادارات والمؤسسات العمومية، الشوارع الرئيسية الهيكلية لمدينة سلا، المركبات السوسيو - اقتصادية والاجتماعية والثقافية، المؤسسات الخدماتية والترفيهية والمركبات التجارية والحدائق والساحات العمومية.
- ▶ إعادة التوقيع على الاتفاقية والتنسيق من أجل تسليم إشعار بالمهمة وتنظيم اجتماع تحضيرى مع مكتب الدراسات المكلف للشروع بالمهمة.





لقاء لتقاسم نتائج الدراسة التشخيصية



ممر عبور يضم منخفض ولوج



تقديم المواكبة التقنية لمشروع تهيئة ساحة قطرة الحليب

## المنجزات الخاصة : مدينة تازة

▶ إطلاق صفقة الدراسة التقنية والطبوغرافية وانتقاء مكتب الدراسات المكلف؛

▶ إطلاق صفقة الأشغال يوم 09 دجنبر 2021، وانتقاء الشركة، بمبلغ 1.573.488,00 درهم.


▶ تضم أشغال الولوجيات الفضاءات العمومية التالية :

▪ مقر الملحقة الإدارية الثانية للجماعة.

▪ شارع محمد الخامس : من ساحة الاستقلال إلى بنك المغرب.

ويشمل هذا الشطر من شارع محمد الخامس مجموعة من المرافق العمومية، أهمها : الملحقة الإدارية الثانية التي يتواجد بها العديد من المصالح الجماعية (الشؤون الاجتماعية، الشبكات الوحيد للتعمير، إلخ)، ولاية الأمن الوطني، وكالة توزيع الماء والكهرباء لتازة، المصالح الخارجية لوزارات الفلاحة والتعمير والتجهيز، الخزينة العامة للمملكة، ثانوية علي بن بري، مرافق ثقافية وترفيهية : معهد الموسيقى، ملعب كرة المضرب، إلخ.

▶ الانتهاء من عملية إرساء الأشغال، وتم منح الشركة المكلفة التسليم المؤقت.

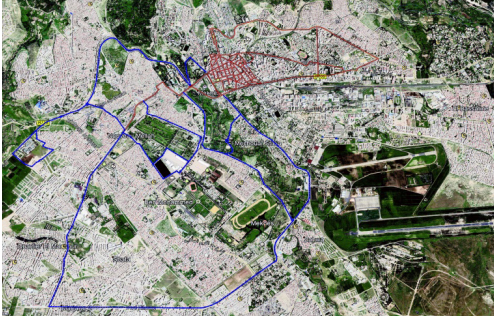

نطاق الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات



لقاء تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات بالمدينة

### المنجزات الخاصة : مدينة مكناس

- ◀ إطلاق صفقة الدراسة التقنية والطبوغرافية في ثلاث مناسبات في شهر دجنبر 2020 وشهري فبراير ودجنبر 2021، لكن لم يتقدم أي متنافس. وفي هذا الصدد، فقد تم تحيين بعض مواد دفتر التحملات الخاص ونظام الاستشارة لجعل الصفقة أكثر جاذبية.
- ◀ ستشمل هذه الدراسة التقنية المواقع التالية :
  - الممرات العمومية : شارع فرحات حشاد، شارع بنغازي، شارع محمد المكناسي، شارع الاتحاد الإفريقي، شارع عبد المومن الأمانى وشارع ادريس الثاني.
  - الفضاءات والبنيات العمومية : ساحة الاستقلال، الحديقة المجاورة لها، قصر المؤتمرات بحميرية ومقر جماعة مكناس.
- ◀ إعادة إطلاق صفقة الدراسة وانتقاء مكتب الدراسات لإنجاز المهمة، وذلك بتكلفة تقدر ب 300.000 درهم.
- ◀ عقد لقاء تحضيرى مع مكتب الدراسات المكلف بحضور المصالح التقنية يوم 19 يناير 2023، خصص لإطلاق عملية إنجاز الدراسات الطبوغرافية وإعداد الوثائق الخاصة لصفقة أشغال الولوجيات.





لقاء لتقاسم نتائج الدراسة التشخيصية



دراسة دفتر التحملات الخاصة ونظام الاستشارة الخاصين بصفقة الأشغال



لوحة مشروع إرساء أشغال الولوجيات

## المنجزات الخاصة : مدينة القنيطرة

- ◀ إطلاق طلب عروض أثمان وتعيين مكتب الدراسات المكلف بإعداد الوثائق التقنية والتصاميم اللازمة لإطلاق صفقة الأشغال، وذلك بتكلفة قدرها 32.000 درهم.
- ◀ الدراسة والمصادقة على المخرجات المطلوبة من هذه الدراسة، وذلك يوم 11 يونيو 2011.
- ◀ تضم أشغال الولوجيات المواقع التالية :
  - الممرات العمومية : شارع القوات المسلحة الملكية (من مقهى ماليزيا إلى مديرية الضرائب)؛ شارع مولاي عبد الرحمان (تقاطع بين زنقة سبتة وزنقة مولاي عبد الله)؛ شارع الحسن الثاني؛ زنقة مولاي عبد الله؛ زنقة سبتة؛ زنقة الملكة إليزابيث؛ زنقة الاستقلال؛ زنقة مجاورة لمقر الجماعة.
  - الفضاءات والبنيات العمومية: منتزه ابن خفاجة؛ منتزه الأطفال؛ الساحة الإدارية؛ ومقر جماعة القنيطرة.
- ◀ إطلاق صفقة أشغال الولوجيات وانتقاء الشركة المكلفة بتنفيذ الأشغال، وذلك بغلاف مالي قدره 1.778.952,00 درهم، ومباشرة عملية الإرساء.
- ◀ الشروع في عملية إنجاز اشغال الولوجيات، ابتداء من 3 نونبر 2022. وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%.



أشغال تثبيت الشرائط التوجيهية بين محطة القطار ومقر البلدية



## المنجزات الخاصة : مدينة بني ملال



نطاق الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات



تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية مع الفعاليات المحلية

▶ إطلاق صفقة الدراسة التقنية والطبوغرافية في مناسبتين في شهري فبراير وماي 2021، لكن لم يتقدم أي متنافس. ويعد تجويد وتحسين بعض مواد دفتر التحملات الخاص ونظام الاستشارة لجعل الصفقة أكثر جاذبية، خاصة الرفع من المبلغ التقديري للصفقة، تمت إعادة إطلاق الصفقة، حيث تم انتقاء مكتب الدراسات المكلف للقيام بالمهمة وذلك بتكلفة 240.000 درهم.

▶ وتهم هذه الدراسة المواقع التالية :

▪ بخصوص الممرات العمومية : شارع محمد الخامس (شطر بين ملتقى تادلة وملتقى حي الشرف)، شارع الحسن الثاني (انطلاقا من المدار السياحي عين أسردون إلى ملتقى مع شارع محمد الخامس)، شارع الجيش الملكي (من ساحة المسيرة إلى الساحة الواقعة بحي المسيرة 2)، شارع القدس (من مقر المحافظة العقارية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مرورا من المقاطعة الثالثة وثانوية الحسن الثاني)، شارع العيون (من بريد المغرب إلى شارع الجيش الملكي مرورا من مقر المقاطعة السادسة ومستوصف GhareNhale)، الأزقة الثانية التي تتواجد بها المقاطعات الإدارية المحيطة من مقر الجماعة.

▪ البنايات المفتوحة للعموم : مقر الجماعة وكذا المقرات الثانية للمقاطعات الإدارية، جميع مراكز الاجتماعية والثقافية التابعة للجماعة.

▪ الساحات العمومية : منتزه عين أسردون وساحة المسيرة.

▶ عقد اجتماع تحضيرري مع مكتب الدراسات، يوم 05 نونبر 2021، والشروع في إنجاز المرحلة الأولى من الدراسة، والتي تهم إعداد الدراسة الطبوغرافية والتصاميم الهندسية اللازمة.


▶ إتمام الدراسة التقنية وإعداد التصاميم والوثائق التقنية التعاقدية اللازمة من أجل إطلاق صفقة أشغال الولوجيات.

▶ إطلاق صفقة الأشغال وقد حدد يوم 18 شتنبر 2023 كموعد لفتح الأظرفة وانتقاء الشركة المكلفة بالإنجاز.



## المنجزات الخاصة : مدينة إنزكان

- ▶ إطلاق صفقة الدراسة التقنية والطبوغرافية خلال ثلاث مناسبات في شهر مارس وأبريل ويوليوز 2021، لكنها لم تكمل بالنجاح، بسبب عدم تقدم أي مترشح أو عدم استيفاء الشروط المحددة في دفتر التحملات. وبعد تجويد وتحسين محتوى بعض مواد الوثائق التعاقدية لجعل الصفقة أكثر جاذبية، تمت إعادة إطلاق الصفقة، حيث تم انتقاء مكتب الدراسات المكلف يوم 21 دجنبر 2021، للقيام بالمهمة وذلك بتكلفة قدرها 157.560 درهم. وتهم هذه الصفقة المواقع التالية :
- بخصوص الطرق والممرات العمومية : شارع محمد الخامس (تقاطع مع شارع الجيش الملكي وشارع المختار السوسي)؛ شارع الجيش الملكي (من ملتقى شارع محمد الخامس إلى ملتقى شارع المختار السوسي)؛ وشارع المختار السوسي؛
- الفضاءات العمومية : محطة سيارات الأجرة الصنف الكبير؛
- البنايات المفتوحة للعموم: مقر جماعة إنزكان؛ مقر مجلس عمالة إنزكان ايت ملول؛ مقر بريد المغرب؛ مرافق مفتوحة العموم؛ وبنايات تجارية.
- ▶ إتمام الدراسة التقنية وإعداد التصاميم والوثائق التقنية التعاقدية اللازمة من أجل إطلاق صفقة أشغال الولوجيات.

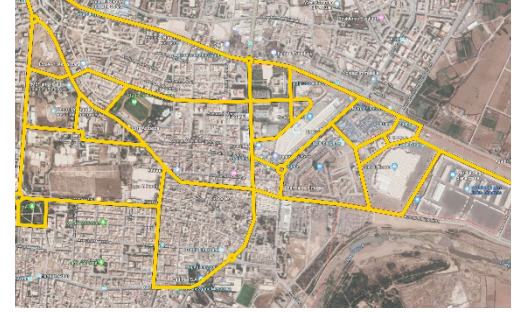

نطاق الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات



تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية مع الفعاليات المحلية بالجماعة بحضور السيد رئيس مجلس الجماعة والسيد رئيس مجلس العمالة

## المنجزات الخاصة : مدينة أكادير

- ◀ رغم عملية التنسيق المستمر وعقد مجموعة من اللقاءات من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشروع الولوجيات، إلا أنه لم يتم إطلاق الدراسة التقنية والطوغرافية بعد، وذلك راجع إلى إطلاق برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024) يشمل من بينه جميع الشوارع المحددة سابقا في هاته الدراسة التقنية.
- ◀ ومن أجل خلق الالتقائية بين هذا المشروع الهيكلي ومشروع الشراكة التي تجمع الوزارة بجماعة أكادير حول الولوجيات، ويهدف تعزيز وتطوير الولوجيات لتصبح مدينة نموذجية، تم اقتراح العمل على البدائل، والتي تتجلى في:
  - تحديد نطاق مجالي جديد للولوجيات، من ممرات رئيسية وفضاءات عمومية تكون قريبة من تلك التي يتم تهيئتها حاليا، ودائما في إطار نتائج الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات بالمدينة، واحتراما قدر الإمكان لسلسلة التنقلات. ويمكن في هذا السياق الانكباب على محيط الكليات والمستشفى الجامعي الجديد والمسجد الأعظم لأكادير.
  - الاقتصار على الولوجيات خارج وداخل البنايات العمومية والفضاءات المفتوحة للمرتفقين التابعة إداريا للمجلس الجماعي لمدينة أكادير.
  - تعزيز الولوجيات المناسبة لفئة المكفوفين والأشخاص في وضعية إعاقة الصمم في الممرات والحدائق التي يتم تهيئتها في إطار برنامج التهيئة الحضرية. كما يمكن التركيز على الولوجيات الخاصة بالبنية التحتية لخطوط وسائل النقل الحضري خاصة محطات وقوف حافلات النقل الحضري وتلك الخاصة بحافلات النقل ذات الجودة العالية «أمل واي». مما سيساهم بدون شك في تحسين جاذبية المدينة.
  - توفير الولوجيات بالمواصفات والضوابط اللازمة في الواجهة الشاطئية للمدينة لتمكين كافة الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الشاطئ والمرافق الترفيهية والسياحية إسوة بباقي فئات المجتمع.



◀ للإشارة، المواقع التي سبق تحديدها من أجل الدراسة التقنية تشمل:

- الطرق والممرات العمومية : شارع محمد الخامس ؛ شارع الحسن الثاني؛ شارع المقاومة ؛ شارع سيدي محمد؛ شارع الجنرال الكثناني شارع الجيش الملكي، طريق فاس؛ شارع مولاي عبد الله؛ شارع 20 غشت؛ طريق الشاطئ؛ زنقة واد زيز؛ (من ملتقى شارع محمد الخامس إلى ملتقى شارع المختار السوسي)؛ وشارع المختار السوسي؛
  - الفضاءات العمومية : ساحة ولي العهد؛ ساحة الأمل؛ وحديقة بن زيدون؛
  - البنايات المفتوحة للعموم: مقر جماعة أكادير؛ مقر ولاية جهة سوس ماسة؛ مقرات المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والتعمير؛ المحطة الإدارية، السوق المركزي؛ الوكالة الحضرية؛ ومسجد لبنان.
- ◀ التنسيق حول البدائل المقترحة، لأجراًة مرحلة إرساء أشغال الولوجيات.



نطاق الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات



تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية مع الفعاليات المحلية



تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية مع الفعاليات المحلية




لقاء تنسيقي لاختيار السيناريو الأنسب للتنفيذ



نطاق الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات

### المنجزات الخاصة : مدينة الجديدة

- ◀ عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية لأعضاء لجنة الإشراف والتتبع، آخرها في 30 نونبر 2021، وتم من خلالها تدقيق تحديد المواقع المعنية بالدراسة الطبوغرافية والتصاميم اللازمة لصفقات أشغال الولوجيات، اعتمادا على مخرجات الدراسات التشخيصية والمسحبة لواقع الولوجيات. وتتجلى هذه المواقع في :
  - الطرق والممرات العمومية : شارع محمد الخامس، شارع محمد السادس وشارع نابول، شارع سويز وشارع النخيل ؛
  - الفضاءات العمومية : ساحة المقاومة، ساحة الشاطئ، ساحة لبريجة وحديقة محمد الخامس بالإضافة إلى العديد من مقرات أخرى عمومية وخاصة؛
  - البنايات المفتوحة للعموم: مقر الجماعة، المقاطعة الإدارية الثانية، صندوق الضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بريد المغرب، مسرح الجديدة، المحافظة العقارية، الخزينة العامة، محطة المسافرين ومحطة سيارات الأجرة الكبيرة
- ◀ التحضير لإطلاق صفقة الدراسة التقنية وإعداد التصاميم اللازمة لصفقة الأشغال.



### 3- مدن السلسلة الثالثة : آسفي ورزازات والداخلة وتطوان وسوق أربعاء الغرب ووزان وبركان وتيزنيت وبوجدور

#### المنجزات المشتركة بين مدن السلسلة الثالثة

- ▶ التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتعاون مع هذه الجماعات،
- ▶ التوقيع على ملاحق للاتفاقيات المذكورة مع هذه الجماعات،
- ▶ رصد وتحويل مبالغ مساهمة الوزارة لإنجاز أشغال الولوجيات (14.75 مليون درهم)،
- ▶ عقد لقاء تواصلية وتحضيري عن بعد، يجمع ممثلي هذه الجماعات الترابية الشريكة من أجل الشروع في إطلاق الدراسات المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات، وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021. ويهدف هذا اللقاء إلى تدعيم المواكبة التقنية التي تقدمها الوزارة للجماعات الترابية الشريكة في برنامج «مدن ولوجة»،
- ▶ تعيين ممثلي الوزارة والجماعات في لجان تتبع وتقييم مضامين اتفاقيات الشراكة والتعاون،
- ▶ إعداد دفتر التحملات الخاصة ونظام الاستشارة الخاصة بالدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات بهذه المدن.



## المنجزات الخاصة : مدينة تطوان



المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة التشخيصية

▶ إطلاق الدراسة التشخيصية والمسحجية لجرد الاحتياجات في مجال التهيئة لتحسين الولوجيات لمدينة تطوان، واختيار مكتب

الدراسات المكلف يوم 29 أبريل 2021، وذلك بتكلفة 330.000 درهم.

▶ تحديد محيط الدراسة التشخيصية التي سينكب عليها مكتب الدراسات المكلف، خلال اجتماع تنسيقي موسع، يوم 7 يوليوز 2022، مع الفعاليات المحلية المكلفة بالبناء والتعمير والإسكان والتجهيز والنقل والسير والجولات والعمران والوقاية المدنية وكذا تمثيلات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الإعاقة.

▶ إنجاز الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات والمصادقة على مخرجاتها، وذلك يوم 19 يناير 2022.

▶ يشمل نطاق الدراسة التشخيصية المواقع التالية :

▪ بخصوص الطرق والممرات العمومية : شارع عبد الخالق طوريس؛ شارع المسيرة؛ شارع واد ليل؛ جزء من شارع مكناس؛ جزء من الطريق الوطنية رقم 13 ؛ شارع 9 أبريل؛ شارع المطار؛ زنقة الشاودري؛ جزء من شارع علي يعتى؛ وجزء من شارع الجولان ؛ ...

▪ الفضاءات العمومية : حديقة دو لوس إنامورادوس ؛ ملاعب القرب للترفيه؛ موقف السيارات بالمطار ؛ ...

▪ البنايات المفتوحة للعموم: المستشفى الإقليمي؛ الصندوق المغربي للتقاعد؛ بريد المغرب؛ ثانوية ومدرسة الأزهر ؛ مسجد الأمة؛ ملعب سانية الرمل؛ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ كلية أصول الدين؛ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛ المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل؛ مطار تطوان؛ وكالة الحوض المائي لوكوس؛ مسجد المصلى؛ ...

▶ إعداد دفتر التحملات الخاصة ونظام الاستشارة الخاصة بالدراسة التقنية والتصاميم اللازمة لأشغال الولوجيات.

▶ إطلاق الصفقة وتقييم العروض وانتقاء الشركة للقيام بالمهمة، وذلك يوم 10 يناير 2023. وقد حدد مبلغ هذه الصفقة ب 115.000 درهم.



## المنجزات الخاصة: مدينة الداخلة

- ▶ إطلاق الدراسة التشخيصية والمسحية لجرد الاحتياجات في مجال التهيئة لتحسين الولوجيات لمدينة الداخلة، وانتقاء مكتب الدراسات المكلف، يوم 28 ماي 2021، وذلك بتكلفة قدرها 400.000 درهم.
- ▶ تحديد محيط الدراسة التشخيصية التي سينكب عنها مكتب الدراسات المكلف، خلال اجتماع تنسيقي موسع، يوم 25 يناير 2022، مع الفعاليات المحلية المكلفة بالبناء والتعمير والإسكان والتجهيز والنقل والسير والجولات والعمران والوقاية المدنية وكذا تمثيلات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الإعاقة.
- ▶ الشروع في إعداد الدراسة التشخيصية لمدينة الداخلة ابتداء من يوم 25 يناير 2022.
- ▶ للإشارة، يشمل نطاق الدراسة التشخيصية المواقع التالية:
  - بخصوص الطرق والممرات العمومية: شارع محمد الخامس؛ شارع 4 مارس؛ شارع المسجد؛ شارع العركوب؛ شارع أحمد الشرقاوي؛ شارع أحمد بن شقرون؛ شارع عبد الرحيم بوعبيد؛ زقة بنجلون؛ شارع باحيني؛ شارع الوحدة العربية وشارع محمد فاضل السملاي؛
  - الفضاءات العمومية: حديقة الرحمة؛ حديقة حي السلام؛ حديقة الولاية؛ كورنيش الداخلة؛ ساحة مسجد السنة؛ ساحة مسجد الدرهم...
  - البنيات المفتوحة للعموم: مقر ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب؛ مقر الجماعة؛ مقر مجلس إقليم الداخلة؛ مقر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب؛ ملحقة أوسرد؛ مسجدي السنة والرحمة؛ المحكمة الابتدائية؛ المركز الجهوي للاستثمار، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ دار الشباب؛ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؛ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ مقر التعاون الوطني؛ المديرية الجهوية للثقافة؛ دائرة بشر انزان؛ معهد التكوين المهني؛ فضاء الذاكرة للمقاومة والتحرير؛ دار المواطن؛ مرافق صحية وتعليمية؛ غرفة الصناعة والتجارة والخدمات؛ محطات النقل؛ أبناءك؛ ...
- ▶ إتمام الدراسة التشخيصية من طرف مكتب الدراسات، وإعداد دفتر التحملات الخاصة ونظام الاستشارة الخاصة بالدراسة التقنية والتصاميم اللازمة لأشغال الولوجيات.
- ▶ التنسيق مع الجماعة من أجل إطلاق الدراسة التقنية والطبوغرافية.




نطاق الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات



تقاسم نتائج الدراسة التشخيصية مع الفعاليات المحلية




## المنجزات الخاصة : مدن سوق أربعاء الغرب ووزان وبركان

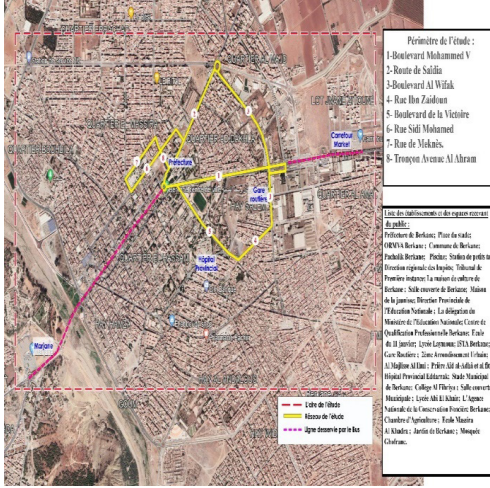

نطاق الدراسة التشخيصية لواقع ولوجيات مدينة بركان

إطلاق صفقات الدراسة التشخيصية والمسحية لجرد الاحتياجات في مجال التهيئة لتحسين الولوجيات بكل من المدن الثلاث:

- **بخصوص مدينة بركان**، تم في 01 يوليوز 2021 انتقاء مكتب الدراسات للقيام بالمهمة وذلك بغلاف مالي 240.000 درهم، وتم إنجاز هذه الدراسة وتقاسم نتائجها مع الفعاليات المحلية من خلال لقاء عقد بتاريخ 06 يناير 2022. كما تم إعداد دفتر التحملات الخاصة للدراسة التقنية والطبوغرافية الخاصة بصفقة اشغال الولوجيات.
  - **بخصوص مدينة وزان**، تم في يوم 29 يوليوز 2021 انتقاء مكتب الدراسات للقيام بالمهمة بتكلفة قدرها 273.000 درهم. وفي يوم 2 فبراير 2023، تم الشروع في إنجاز الدراسة عبر تحديد محيط الدراسة التشخيصية التي سينكب عنها مكتب الدراسات المكلف، وذلك في إطار تشاركي وتوافقي مع الفعاليات المحلية بما فيها تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة. للإشارة أن محيط الدراسة المتوافق عليه يضم تقريبا مختلف الممرات الرئيسية للمدينة انطلاقا من المداخل الأربعة للمدينة (طريق الرباط وطريق أسجن وطريق فاس وطريق شفشاون)، وهي: شارع محمد الخامس، شارع المسيرة الخضراء، شارع علال بن عبد الله، شارع المجازر، شارع القوات المسلحة الملكية وشارع مولاي الحسن.
  - **بخصوص مدينة سوق أربعاء الغرب**، تم في يوم 27 أبريل 2021 انتقاء مكتب الدراسات للقيام بالمهمة وذلك بتكلفة قدرها 210.000 درهم، كما تم تحديد النطاق المجالي الذي ستشمله الدراسة التشخيصية بشكل توافقي مع مختلف الفعاليات المحلية، وذلك بتاريخ 22 شتنبر 2022.
- انجاز الدراسة التشخيصية وتقاسم مخرجاتها مع الفعاليات المحلية وكذا اعداد دفتر التحملات الخاصة بالدراسة التقنية.



## المنجزات الخاصة : مدن آسفي ووزازات وتيزنيت ووجودور


▶ بالنسبة لمدينة آسفي، تم إطلاق صفقة الدراسة التشخيصية، وبعد فتح أظرفة المتنافسين ودراسة العروض التقنية والمالية يوم 16 فبراير 2022، تم انتقاء مكتب الدراسات المكلف بالمهمة، وذلك بتكلفة قدرها 199.200 درهم. كما تم تحديد مجال الدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات بشكل توافقي مع الفعاليات المحلية من خلال اجتماع ليوم 5 يناير 2023. وفي ما يخص نطاق الدراسة التشخيصية المتوافق عليه، فقد شمل الشوارع التالية : شارع مولاي يوسف، شارع ابن خلدون، شارع محمد الخامس، شارع المدينة المنورة، شارع كينيدي، شارع سيدي محمد بن عبد الله. للإشارة أن النطاق المجالي للدراسة المحدد يضم تكتل لأهم التجهيزات والادارات والمؤسسات العمومية (مقري العمالة والجماعة، الوكالة الحضرية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي....).

▶ بالنسبة لمدينة ووزازات، تم إطلاق صفقة الدراسة التشخيصية والمسحية لجرد الاحتياجات في مجال التهيئة لتحسين الولوجيات خلال ثلاث مناسبات: الأولى يوم 26 يوليوز 2021، الثانية يوم 26 أبريل 2022 والثالثة يوم 23 مارس 2023 إلا أنه لم يتم انتقاء أي مكتب للدراسات لعدم استيفاء الشروط المطلوبة في دفتر التحملات. وفي الصفقة الرابعة التي تم إطلاقها يوم 16 ماي 2023، تم انتقاء الشركة للقيام بالمهمة، وذلك بتكلفة مالية 300.000 درهم. تحديد محيط الدراسة التشخيصية بشكل توافقي وتشاركي مع الفعاليات المحلية من سلطات ومصالح خارجية لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، وذلك خلال اجتماع نظم بمقر الجماعة يوم 31 غشت 2023.

ويضم هذا المحيط الشوارع الرئيسية للمدينة وهي شارع ابن سينا، شارع مولاي رشيد، شارع محمد الخامس، شارع محمد السادس، شارع المغرب العربي، شارع النصر، زنقة الموحدين، زنقة إفران وزنقة البريد.

▶ بالنسبة لمدينة تيزنيت، تم إعداد دفتر التحملات الخاصة ونظام الاستشارة الخاصة بالدراسة التشخيصية لواقع الولوجيات، كما تم إطلاق الصفقة وانتقاء مكتب الدراسات للقيام بالمهمة.

▶ بخصوص مدينة وجودور، بناء على نتائج الدراسة المسحية والتشخيصية المنجزة مسبقا، تم إطلاق صفقة الأشغال وانتقاء الشركة للقيام بالمهمة بتكلفة مالية 1.831.188,00 درهم، وذلك يوم 27 أبريل 2023. وقد تم الشروع في إرساء أشغال الولوجيات، همت الشوارع الرئيسية للمدينة (شارع الحسن الثاني وشارع بابي وشارع مولاي رشيد وشارع لالة مريم وشارع ولي العهد وشارع عبد الخالق الطوريس) وكذا الملتقيات بالإضافة إلى المداخل الخارجية للبنى التحتية المفتوحة للعموم كالملاحقة الإدارية الثالثة ودائرة جريفة ودار الشباب للتنمية وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير... وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90%.

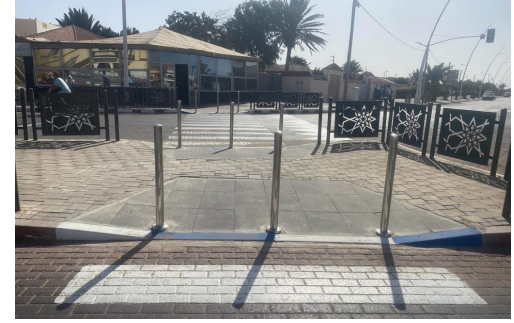

مدن ولوجية



## 4- كرونوكرام تركيبي

إرساء أشغال الولوجيات			الدراسة التقنية واعداد التصاميم			تشخيص واقع الولوجيات			المدن الشركة في البرنامج
تقييم	مرحلة تنفيذ الأشغال	إطلاق صفقات الأشغال واختيار الشركة المكلفة	إعداد الوثائق اللازمة لصفقة الدراسة	إطلاق الصفقة وتعيين مكتب الدراسات	انجاز الدراسة التقنية والتصاميم وإعداد دفتر التحصلات صفقة الأشغال	تفاسم مخرجاتها مع الفعاليات المحلية	إعداد الدراسة	إطلاق صفقة الدراسة وتعيين مكتب الدراسات المكلف	
									المدن البيضاء
									وجدة
									تازة
									القنيطرة
									بوجور
									طنجة
									فاس
									بني ملال
									إيزراكن
									سلا
									مكناس
									تطوان
									الرباط
									أكادير
									الجديدة
									المخاضة
									بركان
									سوق أرحاء الغرب
									وزان
									آسفي
									ورزازات
									تيزيقت



## 12. منجزات البرنامج : مجال تقوية القدرات



دورة تكوينية في مجال الولوجيات بمدينة تطوان



دورة تكوينية في مجال الولوجيات بمدينة بركان

- ◀ تنظيم 12 ورشة تكوينية في مجال الولوجيات بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة وفاس وأكادير ومراكش، استفاد من خلالها حوالي 400 مهندسا معماريا وتقنيا تابعا للجماعات الترابية والوكالات الحضرية، وكذا أطر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في إطار برنامج التعاون مع البنك الدولي يروم تحسن التنقلات الحضرية لفائدة الأشخاص محدودي الحركة.
- ◀ كما تم تنظيم 4 دورات تكوينية في مجال الولوجيات بمدن أكادير (خلال يومي 18 و 19 فبراير 2020) وبركان (يومي 6 و 7 يناير 2022) وتطوان (يومي 19 و 20 يناير 2022) والداخلة (خلال يومي 26 و 27 يناير 2022). وقد استفاد من خلالها 84 من الأطر التقنية للجماعات الأربع والأطر التقنية للجماعات الترابية المجاورة لها وكذا المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المكلفة بالبناء والتعمير والإسكان والتهيئة الحضرية والتجهيز والنقل والعمران والسير والجولان والوقاية المدنية بالإضافة إلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
- ◀ ومن أجل استكمال التزامات الوزارة المتضمنة في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمعها مع الجماعات الترابية الشريكة، والخاصة بمجال تقوية القدرات، تعمل الوزارة على برمجة سلسلة من دورات تكوينية لفائدة الفعاليات المحلية بالجماعات الترابية بمدن القنيطرة وأسفي وبنو ملال وسوق أربعاء الغرب ووزان وورزازات وتيزنيت وسلا والجديدة وفاس ومكناس وتازة وبوجدور وإنزكان آيت ملول.
- ◀ وتتضمن هذه الورشات التكوينية وحدات نظرية وأعمال تطبيقية يستفيد منها بالإضافة إلى المصالح التقنية للجماعات الترابية المذكورة، الأطر التقنية التابعة للوكالات الحضرية وللعمران وكذا للمصالح الخارجية للقطاعات المعنية من مهندسين معماريين وتقنيين.



## 13. منجزات البرنامج : مجال التوعية والتحسيس



لقاء تأطيري منعقد يوم 17 يونيو 2019 بمقر الوزارة، بحضور ممثلي الوزارة ورؤساء الجماعات وممثلي المصالح التقنية التابعة لها، ومكتب الدراسات المكلف، لإعطاء انطلاقة الدراسة التشخيصية لواقعولوجيات بالجماعات الترابية التسعة

بهدف تطوير ثقافةولوجيات والمساهمة في تغيير التمثيلات المجتمعية حول الموضوع، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجماعات الترابية على وضع وتنفيذ برامج توعوية وتحسيسية في مجالولوجيات تروم إذكاء وعي الفاعلين بأهمية إدراجولوجيات ضمن البرامج التي تشرف عليها، وكذا حسن إعمال وإرساء أشغالولوجيات في احترام تام للخصائص الفنية والمعايير اللازمة. وفي هذا الإطار تم تنظيم اللقاءات التالية :

◀ حملة تحسيسية وطنية حولولوجيات تحت شعار: « توفيرولوجيات تسهيل للحياة...» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الممتدة بين 14 نونبر و 3 دجنبر 2016، وقد تميزت هذه الحملة بلقاء وطني ولقاءات جهوية كاملة.


◀ لقاء تواصلية وتفاعلية مع ممثلي الجماعات الترابية الشريكة للوقوف على مدى تقدم التنفيذ الترابي لهذا البرنامج وكذا تقاسم بعض الممارسات الفضلى التي تم رصدها أثناء اللقاءات التنسيقية مع الجماعات الترابية الشريكة (فاس-سلا-الدار البيضاء) مرتبطة بتحسين وتدبير مجال التهيئة، وذلك يوم 11 نونبر 2020.



- ◀ لقاء تواصلية وتحضيرية عن بعد، جمع ممثلي الجماعات الترابية الشريكة التي استفادت من دعم الوزارة برسم ميزانية 2020 من أجل الشروع في إطلاق الدراسات المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات، وتدعيم المواكبة التقنية التي تقدمها الوزارة للجماعات، وذلك يوم 16 فبراير 2021.
- ◀ لقاء تواصلية وتحسيسية حول البرنامج الوطني «مدن ولوجة»، نظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك يوم 09 دجنبر 2021. ويهدف هذا اللقاء إلى الوقوف على مدى تقدم مشاريع الولوجيات ودراسة الصعوبات المطروحة وكذا تقاسم الممارسات الجيدة بين الجماعات الترابية الشريكة. وشهد اللقاء مشاركة مجالس الأقاليم والعمالات ووزارة التعمير ومجموعة العمران ومختلف الشركاء الآخرين.
- ◀ لقاء تحسيسية، عبر المناظرة المرئية، مع الجماعات الترابية الشريكة في البرنامج والمجالس الترابية للعمالات والأقاليم، على هامش زيارة السيدة الوزيرة لمدينة بوجدور، وذلك صبيحة يوم 06 ماي 2023.
- ◀ وتهدف هذه اللقاءات بالأساس إلى إذكاء وعي مختلف الفاعلين الترابيين والشركاء بأهمية الولوجيات والعمل على استحضارها في مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالتهيئة والتعمير والنقل، وكذا ترسيخ أواصر التعاون مع المجالس المنتخبة باعتبارهم شركاء وفاعلين أساسيين في التنمية المحلية، بالإضافة إلى تقاسم الممارسات الجيدة والتجارب والخبرات المكتسبة بين الجماعات الترابية للدفع بعملية إنجاز هذا البرنامج الطموح.



# 14. أعمال موازية للبرنامج : تطوير الرصيد المعياري للولوجيات

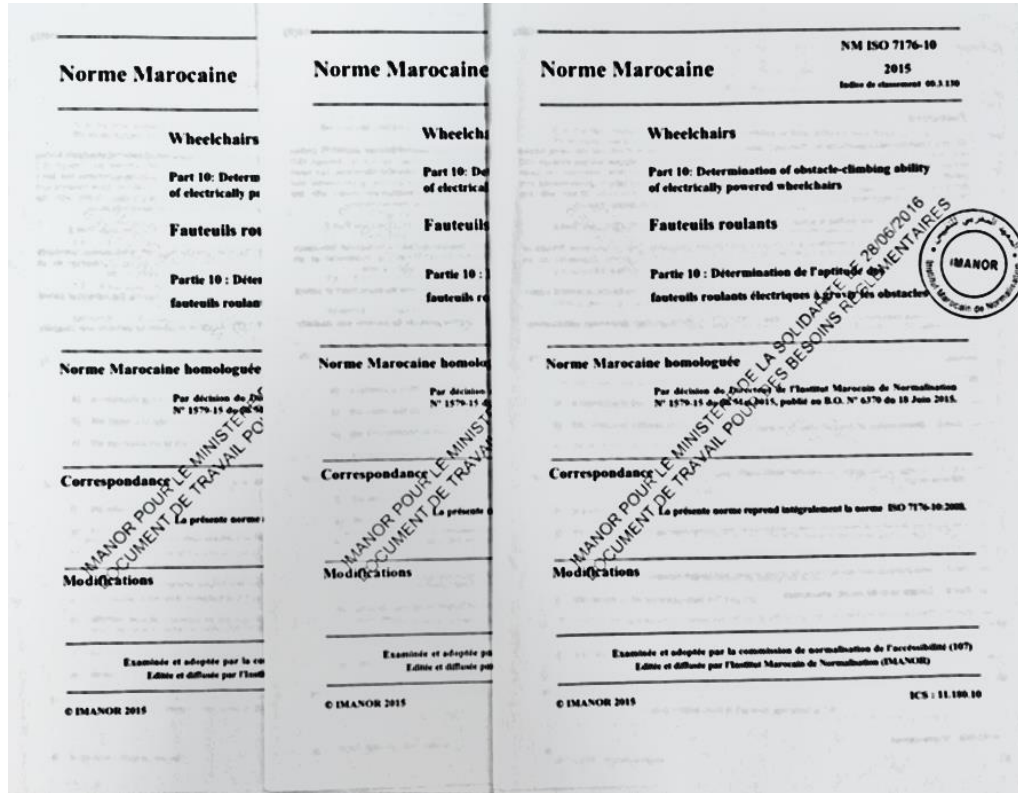

من أجل إغناء وتطوير الرصيد المعياري المغربي في مجال الولوجيات سواء من جانب البناء أو التعمير أو مرتبط بالنقل أو التواصل، ومساعدة الفاعلين المختصين والتقنيين المباشرين في حسن أعمال الولوجيات بالشكل اللازم والمطلوب، تم إحداث لجنة التقييس المتعلقة بالولوجيات سنة 2012 بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة وتكلف بإعداد المواصفات القياسية في المجال. وقد مكنت أعمال هذه اللجنة من الدراسة والمصادقة على ما يعادل 80 مشروعا معياريا مغربيا.



## 15. أعمال موازية للبرنامج : تطوير الشراكة مع الفاعلين

في إطار توحيد الجهود بين القطاعات المعنية للنهوض بمجال الولوجيات ببلادنا، أبرمت الوزارة، مجموعة اتفاقيات شراكة أهمها:

- ◀ اتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أبرمت يوم 14 يناير 2020. وتهدف هذه الاتفاقية لاستحضار الولوجيات في تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان، وتقوية القدرات في مجال الولوجيات، وكذا إطلاق عمليات تواصلية تروم دعم تنفيذ مضمين القرارين المشتركين بالولوجيات العمرانية والمعمارية.
- ◀ اتفاقية مع مجموعة العمران، أبرمت يوم 12 يناير 2021، في مجال تطوير القدرات ودعم لوجيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز حق الولوج إلى السكن وإطلاق شعار «إدارة ولوجة» لتشجيع المسؤولين على توفير الولوجيات في المرافق العمومية. ويتجلى أهم ما تم إنجازه في إطار الاتفاقية ما يلي:
  - مراجعة وتحسين دفاتر التحملات التعاقدية ودلائل الممارسات الجيدة الخاصة بالدراسات التقنية المعمارية والعمرانية التي تشتغل بها العمران، وفق ضوابط الولوجيات؛
  - مواكبة مجموعة العمران في المشروع النموذجي «تمنصورت مدينة ولوجة»، وفق المقاربات المعتمدة في البرنامج الوطني «مدن ولوجة»؛
  - التحضير لإطلاق الدراسة التشخيصية لجرد احتياجات الولوجيات لبعض مراكز الرعاية الاجتماعية المتواجدة بتراب جهة الرباط - سلا - القنيطرة.
  - تقديم المساعدة ومواكبة التقنية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسية بالرباط حول كيفية وضع شرائط توجيهية وبقطة تساعد الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتنقل في الحرم الجامعي والولوج إلى كافة المواقف إسوة بكافة الفئات الطلابية الأخرى.



المواكبة التقنية لمشروع العمران الخاص بتمنصورت «مدينة ولوجة»

الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين  
المملكة المغربية



ROYAUME DU MAROC  
ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES



Groupe  
al omrane



وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  
و الإسكان و سياسة المدينة



- ◀ كما تم تقديم الملاحظات والحلول التقنية لتحسين الولوجيات العمرانية والمعمارية في الممرات والمنحدرات المؤدية لمختلف أروقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسية (الإدارة، مصلحة الشؤون الطلابية، قاعات التدريس، مدرجات مكتبة...).





رصد لبعض الاختلالات على مستوى احترام معايير الولوجيات




معاينة ميدانية لأشغال الشطر الأول من برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير

◀ تقديم المواكبة التقنية لفائدة المصالح التقنية المكلفة بالتجهيز والتعمير بجماعة أكادير، حول الضوابط والمعايير اللازمة في مجال الولوجيات الواجب احترامها أثناء إرساء أشغال البرنامج الهيكلي للتهيئة الحضرية التي تشهدها مدينة أكادير (-2020 2024)، وكذا مناقشة الاشكاليات والصعوبات المطروحة.

◀ من خلال زيارة ميدانية عملية قامت بها الوزارة رفقة المصالح التقنية للجماعة، يوم 16 دجنبر 2021، لبعض أورش التهيئة شملت شارع محمد السادس وشارع علال بن عبد الله المحيطة بمقر الجماعة وكذا حديقة ابن زيدون، تم رصد بعض النواقص والوقوف على بعض معايير وضوابط الولوجيات غير محترمة في بداية إرساء أشغال الشطر الأول من برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير وتقديم توضيحات وحلول عملية لإصلاحها.

◀ تقاسم الممارسات الجيدة وتقديم الملاحظات التقنية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في باقي أشغال التهيئة لتسهيل حركية وتنقل الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة فئة المكفوفين وضعاف البصر ومستعملي الكراسي المتحركة سواء في الممرات العمومية أو الحدائق المفتوحة للعموم. وموازة مع ذلك قدمت الوزارة وثائق تضم المعايير التقنية المعتمدة لممثلي شركة سوس ماسة للتهيئة، عبارة عن القرارين المشتركين المتعلقة بمعايير الولوجيات المعمارية والعمرانية.

◀ تم التأكيد من طرف الوزارة على أهمية خلق لجنة محلية على مستوى الجماعة تكون مهمتها مراقبة واحترام المعايير والضوابط اللازمة للولوجيات، وكذا إعداد تقارير وتقديم اقتراحات لتحسين وضعية الولوجيات بالمدينة. وتضم بالأساس المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المكلفة بالتعمير والإسكان والعمران والنقل والسياحة بالإضافة إلى تمثيلات الجمعيات المحلية العاملة في مجال الإعاقة.



## 16. أهم استنتاجات زيارات التتبع الميدانية

- ◀ اعتماد مقارنة تشاركية واضحة في تدبير مختلف مراحل المشروع من طرف الجماعات الترابية الشريكة، تنجلى في إشراك مختلف الفعاليات المحلية، خاصة الجمعيات والفئات المعنية بالإعاقة.
- ◀ استيعاب وتملك تدريجي ملموس لمختلف الضوابط والمعايير التقنية المؤطرة للولوجيات المعمارية والعمرائية.
- ◀ التزام الجماعات بالحرص على استحضار بعد الولوجيات في مشاريع التهيئة الحضريية الجارية والمبرمجة، خاصة في الوثائق التقنية المرتبطة بصفقات الأشغال.
- ◀ رصد بعض الممارسات الجيدة لبعض الجماعات في مجال استحضار الولوجيات في مجال التعمير.
- ◀ ضرورة ملحة لتقوية قدرات الأطر التقنية للجماعات في مجال الولوجيات، خصوصا في التعامل مع الإطار المبني القائم، للرفع من القدرة على اقتراح حلول مبتكرة وفعالة لمختلف الإشكالات المطوحة ميدانيا.
- ◀ وجوب تطوير ثقافة الولوجيات من خلال إطلاق حملات توعوية وتحسيسية تروم تغيير التمثلات المجتمعية حول موضوع الإعاقة وكذا إدكاء وعي الفاعلين المحليين بأهمية إدراج بعد الإعاقة ضمن المخططات والبرامج التنموية الترابية التي يشرفون عليها.



## 17. أبرز الصعوبات المطروحة

- ◀ بظاً في إنتاج النصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الولوجيات، وكذا نقص في الترسانة المعيارية المغربية الخاصة بمجالات الولوجيات خاصة تلك المرتبطة مجالي النقل والتواصل.
- ◀ محدودية تطبيق الولوجيات المرتبطة بالنقل والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، وكذا ضعف إدماج بعد الولوجيات في المخططات الوطنية والترايبية للتنمية.
- ◀ الإلزام غير الكافي بالضوابط والمعايير التقنية للولوجيات من قبل العاملين في مجالات البناء والمعمار والاتصال والنقل وإن طبقت فهي لا تحترم الخصائص الفنية والمعايير الدقيقة المطلوبة واللازمة.
- ◀ انخراط محتشم للفاعلين في احترام الولوجيات وفي التزامهم بالمعايير الضرورية وخصوصا القطاعات الوزارية والمؤسسات والجماعات الترابية والمكلفة أصلا بإعداد وتنفيذ برامج التهيئة والبناء.
- ◀ قلة الخبرات المختصة في مجال العمل على توفير الولوجيات وضعف في عملية النشر والإخبار للمهنيين.





